

大阪府茨木市 N様

建物概要 2階建て木造住宅 屋根 湿式和瓦 外壁モルタル塗装仕上げ

工事内容 屋根改修工事（湿式和瓦～カラーベスト）

雨樋改修工事（半円 105～PC50）

破風板新設工事（窯業系 180）

軒天新設工事（ケイカル t=5.5）

工事の経緯


ある晩にドサッ！と音がして外を確認すると屋根の軒先が折れて落ちていたとのことでした。幸い怪我人は無かったので良かったのですが、まさか軒先が折れる事があったとしても、落ちるとは！私も初めて拝見しました。

屋根を解体したところ、中の下地が腐っていたので永い間、漏水を起こして気が腐り土葺きの瓦の重さに耐えられなくなり落ちたような形でした。


室内天井には漏水の跡が無かったので、きっと壁内を通っている様子でした。

しかし今回は屋根周りの修復だけでとの事になり屋根、雨樋、破風板、軒天の工事をさせていただきました。

工事前

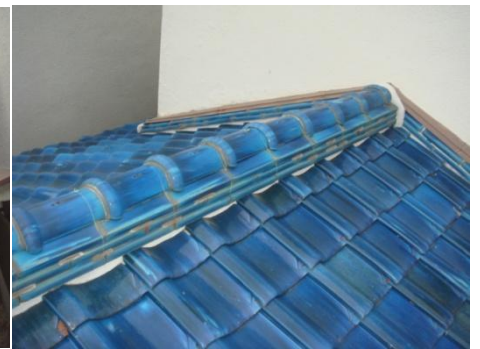

工事完了後

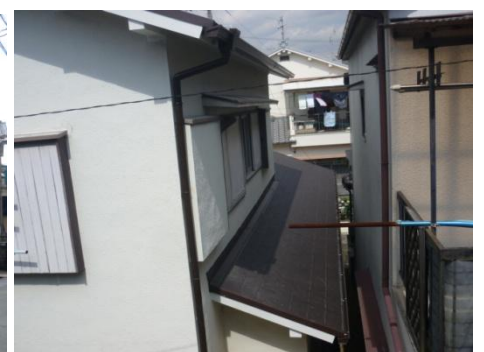



RT工業株式会社
